




# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ  
AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI STRIGNO SULLA  
S.P. N. 78 "DEL TESINO"  
OPERA N. 102

– PROGETTO ESECUTIVO –

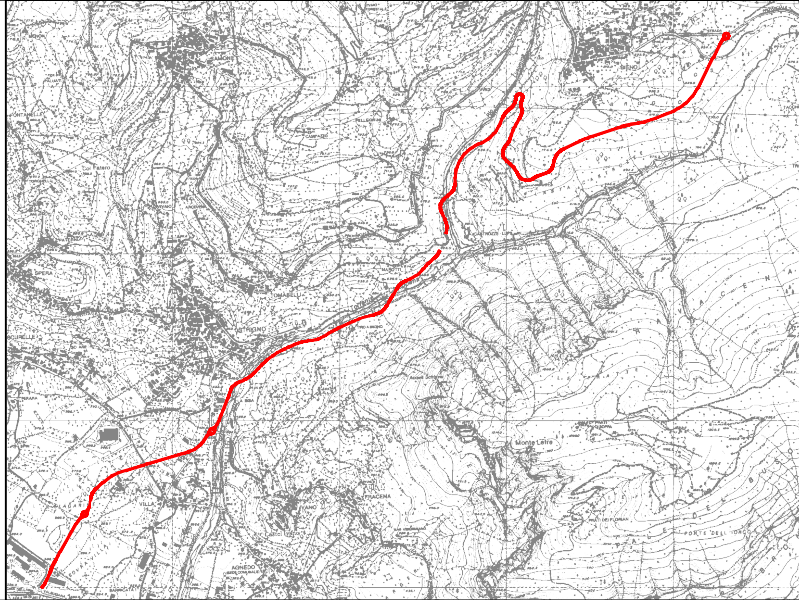

TITOLO TAVOLA :

WBS ESPLOSA

FASE PROGETTO

**E**

TIPO ELAB.

**R**

CATEGORIA

**140**

PARTE D'OPERA

**-**

N° PROG.

**15**

REVISIONE

**-**

SCALA

**-**

REDAZIONE:

DATA REDAZIONE: settembre 2013

COPIA N.: 1

PROGETTAZIONE



PROGETTISTA

Dott.Ing. Erino Bombardelli

**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO**

**dott. ing. ERINO BOMBARDELLI  
ISCRIZIONE ALEO N. 1098**

COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Dott.Ing. Erino Bombardelli

**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO**

**dott. ing. ERINO BOMBARDELLI  
ISCRIZIONE ALEO N. 1098**

IL REFERENTE INTERNO

Geom.Sergio Gerosa

GEOLOGIA

Dott.Geol. Rinaldo Bussola

Visto! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Ing. Mario MONACO

Visto! IL DIRIGENTE

Ing. Luciano MARTORANO

TIMBRO :



CODICE COMMESSA

AE.12.0014

NOME FILE: 330 ER\_140\_15 WBS ESPLOSA.DWG

PLOTTAGGIO:

n° PAT: 350

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO					
	Importo	%		Importo	%	WP	N.	Importo	%		
TRATTA A-A'	€ 89 239,24	0,28%									
			A.1 Innesto su SS 47 - Sistemazioni	1 094,65	1,23%						
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>					
						1.01 DEMOLIZIONI	1	1 094,65	100,00%		
								€ 1 094,65	100,00%		
			A.2 Corpo stradale da sez A1 a sez A37	74 603,69	83,60%						
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>					
						1.01 DEMOLIZIONI	2	23 775,96	31,87%		
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI		907,20	1,22%		
						<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>					
						2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	3	8 363,73	11,21%		
						<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>					
						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	4	8 555,10	11,47%		
						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>					
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	5	2 067,20	2,77%		
						5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	6	30 934,50	41,47%		
								€ 74 603,69	100,00%		
			A.3 Innesto Diramazione Loc. Spin:	13 540,90	15,17%						
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>					
						1.01 DEMOLIZIONI	7	5 725,70	42,28%		
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	8	2 509,20	18,53%		
						<b>6 IMPIANTI</b>					
						6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	9	5 306,00	39,18%		
								€ 13 540,90	100,00%		
				89 239,24	100,00%						

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO				
	Importo	%		Importo	%	WP	N.	Importo	%	
TRATTA RA-RA'	€ 37 713,95	0,12%								
			D.1 Anello e Innessi Rotatoria RA	33 961,51	90,05%					
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>				
						1.01 DEMOLIZIONI	10	487,25	1,43%	
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	11	6 448,10	18,99%	
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	12	5 437,57	16,01%	
						<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>				
						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	13	3 943,60	11,61%	
						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>				
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	14	5 402,54	15,91%	
						5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	15	2 739,75	8,07%	
						<b>6 IMPIANTI</b>				
						6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	16	9 502,70	27,98%	
								€ 33 961,51	100,00%	
			D.3 Viabilità secondaria: Pista X-X' - Corpo	3 752,44	9,95%					
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>				
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	17	1 225,00	32,65%	
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	18	1 463,44	39,00%	
						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>				
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	19	1 064,00	28,35%	
								€ 3 752,44	100,00%	
				37 713,95	100,00%					

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO			
Importo	%		Importo	%		WP	N.	Importo	%
TRATTA B-B'	€ 3 089 065,39	9,72%							
			B.1 Corpo stradale da sez B1 a sez B44	223 071,36	7,22%				
						1			
						1.01	20	12 157,85	5,45%
						1.02	21	80 399,09	36,04%
						1.03	22	25 454,50	11,41%
						2			
						2.01	23	2 030,50	0,91%
						3			
						3.02	24	75 768,75	33,97%
						5			
						5.01	25	26 050,67	11,68%
						5.02	26	1 210,00	0,54%
								€ 223 071,36	100,00%
			B.2 Muro di controripa sez B38-B44 lato dx	107 233,46	3,47%				
						1			
						1.02	27	2 645,63	2,47%
						2			
						2.01	28	94 669,37	88,28%
						3			
						3.02	29	9 847,96	9,18%
						5			
						5.02	30	70,50	0,07%
								€ 107 233,46	100,00%
			B.3 Muro di controripa sez B38-B44 lato sx	103 497,46	3,35%				
						1			
						1.02	31	2 645,63	2,56%
						2			
						2.01	32	91 003,87	87,93%
						3			
						3.02	33	9 847,96	9,52%
								€ 103 497,46	100,00%
			B.4 Galleria artificiale 'Villa Agnedo' (sez B48	1 729 276,54	55,98%				
						1			
						1.02	34	19 817,00	1,15%
						1.03	35	795,60	0,05%
						2			
						2.01	36	133 605,53	7,73%
						2.05	37	1 279 547,00	73,99%
						3			
						3.01	38	60 364,84	3,49%
						3.02	39	139 546,25	8,07%
						5			
						5.01	40	6 511,68	0,38%

					5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	41	291,20	0,02%
					<b>6 IMPIANTI</b>			
					6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	42	34 646,90	2,00%
					<b>7 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI</b>			
					7.01 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI DOLOMITI RETI	43	5 424,64	0,31%
					7.02 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	44	48 725,90	2,82%
							€ 1 729 276,54	100,00%
				B.5 Corpo stradale da sez B58 a sez B86	379 706,11	12,29%		
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.01 DEMOLIZIONI	45	690,65	0,18%
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	46	205 550,35	54,13%
					1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	47	48 994,49	12,90%
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	48	10 341,75	2,72%
					2.03 MANUFATTI FERROSI E LEGHE	49	5 796,50	1,53%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	50	60 486,35	15,93%
					<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	51	15 084,02	3,97%
					5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	52	32 762,00	8,63%
							€ 379 706,11	100,00%
				B.6 Muro di controripa sez B56-B69 lato dx	208 739,75	6,76%		
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	53	4 762,13	2,28%
					1.04 TERRE RINFORZATE	54	26 864,00	12,87%
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	55	157 357,07	75,38%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	56	19 756,55	9,46%
							€ 208 739,75	100,00%
				B.7 Muro di controripa sez B56-B69 lato sx	244 033,16	7,90%		
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	57	5 397,08	2,21%
					1.04 TERRE RINFORZATE	58	49 484,24	20,28%
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	59	169 833,01	69,59%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	60	19 318,83	7,92%
							€ 244 033,16	100,00%
				B.8 Muro di sostegno sez B76-B86 lato sx	86 101,64	2,79%		
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	61	2 751,45	3,20%
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	62	73 964,66	85,90%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	63	9 385,53	10,90%
							€ 86 101,64	100,00%

			<b>B.9 Viabilità secondaria: Pista Y-Y' - Corpo</b>	<b>1 475,73</b>	<b>0,05%</b>				
						<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	64	446,88 30,28%
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	65	162,45 11,01%
						<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>		
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	66	866,40 58,71%
									<b>€ 1 475,73 100,00%</b>
			<b>B.10 Viabilità secondaria: Pista H-H' - Corpo</b>	<b>5 930,18</b>	<b>0,19%</b>				
						<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	67	1 001,39 16,89%
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	68	3 679,35 62,04%
						<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>		
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	69	1 249,44 21,07%
									<b>€ 5 930,18 100,00%</b>
				<b>3 089 065,39</b>	<b>100,00%</b>				

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO					
Importo		%	Importo		%	WP		N.	Importo		%
TRATTA RB-RB'	€ 151 257,38	0,48%									
			E.1 Anello e Innesti Rotatoria RB	71 556,00	47,31%						
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA				
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	70	7 644,71	10,68%	
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	71	16 211,27	22,66%	
						3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE				
						3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	72	10 887,00	15,21%	
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	73	5 554,23	7,76%	
						5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	74	18 963,49	26,50%	
						6	IMPIANTI				
						6.01	PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	75	12 295,30	17,18%	
									€ 71 556,00	100,00%	
			E.2 Viabilità secondaria: Pista E-E' - Corpo	59 616,14	39,41%						
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA				
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	76	820,85	1,38%	
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	77	50 409,30	84,56%	
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	78	8 385,99	14,07%	
									€ 59 616,14	100,00%	
			E.3 Viabilità secondaria: Pista F-F' - Corpo	11 988,46	7,93%						
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA				
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	79	1 973,55	16,46%	
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	80	1 244,53	10,38%	
						3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE				
						3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	81	7 023,90	58,59%	
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	82	1 746,48	14,57%	
									€ 11 988,46	100,00%	
			E.4 Viabilità secondaria: Pista G-G' - Corpo	8 096,78	5,35%						
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA				
						1.01	DEMOLIZIONI	83	828,00	10,23%	
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	84	1 973,55	24,37%	
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	85	1 053,25	13,01%	
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	86	1 746,48	21,57%	
						5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	87	2 495,50	30,82%	
									€ 8 096,78	100,00%	
				151 257,38	100,00%						

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO			
Importo	%		Importo	%		WP	N.	Importo	%
TRATTA C-C'	€ 27 752 471,92	87,37%							
			C.1 Corpo stradale da sez C1 a sez C28	460 017,08	1,66%				
						1			
						1.02	88	98 565,10	21,43%
						1.03	89	57 219,93	12,44%
						1.04	90	190 731,72	41,46%
						3			
						3.02	91	14 624,60	3,18%
						5			
						5.01	92	13 224,76	2,87%
						6			
						6.02	93	51 068,68	11,10%
						7			
						7.02	94	34 582,29	7,52%
								€ 460 017,08	100,00%
			C.2 Sovralzo arginale sez C12-C23 dx	591 417,93	2,13%				
						1			
						1.02	95	1 206,83	0,20%
						2			
						2.01	96	96 612,89	16,34%
						3			
						3.02	97	17 388,82	2,94%
						4			
						4.01	98	476 209,39	80,52%
								€ 591 417,93	100,00%
			C.3 Muro di sostegno sez C15-C23 lato sx	147 158,48	0,53%				
						1			
						1.02	99	2 305,63	1,57%
						2			
						2.01	100	126 401,79	85,90%
						3			
						3.02	101	18 451,06	12,54%
								€ 147 158,48	100,00%
			C.4 Muro arginale sez C22-C49 sx Chieppena	196 312,62	0,71%				
						4			
						4.02	102	196 312,62	100,00%
								€ 196 312,62	100,00%
			C.5 Muro arginale sez C24-C33 dx Chieppena	1 442 923,39	5,20%				
						1			
						1.02	103	2 569,13	0,18%
						2			
						2.01	104	1 420 309,33	98,43%
						3			



					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	105	20 044,93	1,39%
							€ 1 442 923,39	100,00%
			C.6 I° Ponte sul Torrente Chieppena (sez	1 161 537,69	4,19%			
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.01 DEMOLIZIONI	106	22 338,00	1,92%
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	107	13 796,81	1,19%
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	108	381 626,32	32,86%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	109	10 943,00	0,94%
					<b>4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
					4.01 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	110	727 437,05	62,63%
					4.02 PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE - SCOGLIERE	111	5 396,51	0,46%
							€ 1 161 537,69	100,00%
			C.7 I° Ponte sul Torrente Chieppena (sez	1 134 414,25	4,09%			
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	112	131 225,75	11,57%
					2.02 IMPALCATI ED ACCESSORI (GIUNTI-APPOGGI)	113	946 378,22	83,42%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.01 IMPERMEABILIZZAZIONI	114	29 673,08	2,62%
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	115	7 298,70	0,64%
					<b>6 IMPIANTI</b>			
					6.02 COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	116	19 838,50	1,75%
							€ 1 134 414,25	100,00%
			C.8 Corpo stradale da sez C35 a sez C124	1 291 695,96	4,65%			
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.01 DEMOLIZIONI	117	37 707,00	2,92%
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	118	229 778,13	17,79%
					1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	119	142 206,94	11,01%
					1.04 TERRE RINFORZATE	120	555 780,27	43,03%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	121	68 809,35	5,33%
					<b>4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
					4.02 PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE - SCOGLIERE	122	43 200,08	3,34%
					<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	123	43 253,12	3,35%
					5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	124	11 322,15	0,88%
					<b>6 IMPIANTI</b>			
					6.02 COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	125	159 638,92	12,36%
							€ 1 291 695,96	100,00%
			C.10 Muro arginale sez C74-C83 sx Chieppena	184 750,43	0,67%			
					<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	126	2 206,81	1,19%
					<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	127	163 443,98	88,47%
					<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	128	19 099,64	10,34%
							€ 184 750,43	100,00%

		C.11 Muro di sostegno sez C89-C92 lato sx	243 659,09	0,88%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	129	4 084,25	1,68%
					2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	130	206 060,25	84,57%
					3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	131	33 514,59	13,75%
								€ 243 659,09	100,00%
		C.12 Anello e Innesti Rotatoria RB	25 622,10	0,09%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	132	658,75	2,57%
					2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	133	21 727,44	84,80%
					3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	134	3 235,91	12,63%
								€ 25 622,10	100,00%
		C.14 II° Ponte sul Torrente Chieppena (sez	1 493 380,67	5,38%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	135	49 697,01	3,33%
					2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	136	617 380,68	41,34%
					3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	137	58 934,20	3,95%
					4	OPERE SPECIALI NEL TERRENO			
					4.01	PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	138	661 544,58	44,30%
					4.02	PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE - SCOGLIERE	139	60 576,00	4,06%
					5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI			
					5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	140	14 588,70	0,98%
					6	IMPIANTI			
					6.02	COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	141	30 659,50	2,05%
								€ 1 493 380,67	100,00%
		C.15 II° Ponte sul Torrente Chieppena (sez	2 808 124,73	10,12%					
					2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	142	20 250,78	0,72%
					2.02	IMPALCATI ED ACCESSORI (GIUNTI-APPOGGI)	143	2 717 379,53	96,77%
					3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	144	54 807,92	1,95%
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	145	15 584,50	0,55%
					6	IMPIANTI			
					6.01	PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO		102,00	0,00%
								€ 2 808 124,73	100,00%
		C.16 Corpo stradale da sez C140 a sez C172	983 976,85	3,55%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	146	195 380,02	19,86%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	147	39 409,72	4,01%
					1.04	TERRE RINFORZATE	148	227 057,35	23,08%
					3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE			

						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	149	49 788,00	5,06%
						<b>4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
						4.01 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	150	377 755,82	38,39%
						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	151	14 698,10	1,49%
						5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	152	2 243,25	0,23%
						<b>6 IMPIANTI</b>			
						6.02 COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	153	74 571,09	7,58%
						<b>7 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI</b>			
						7.01 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI DOLOMITI RETI	154	3 073,50	0,31%
								€ 983 976,85	100,00%
			C.17 Muro di sostegno sez C140-C142 lato dx	70 610,22	0,25%				
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	155	1 317,50	1,87%
						<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
						2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	156	60 677,79	85,93%
						<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	157	8 614,93	12,20%
								€ 70 610,22	100,00%
			C.18 Galleria Naturale "Castrozze-Lupi" (sez	3 053 527,82	11,00%				
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	158	1 541,85	0,05%
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	159	536,25	0,02%
						<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
						2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	160	287 125,34	9,40%
						2.04 GALLERIE - SCAVO E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E/O SOSTEGNO DI	161	2 662 924,88	87,21%
						2.05 GALLERIE - RIVESTIMENTO DEFINITIVO E ACCESSORI: CASSEFORMI-CLS PER	162	5 880,00	0,19%
						<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	163	50 777,30	1,66%
						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	164	3 135,00	0,10%
						<b>6 IMPIANTI</b>			
						6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	165	41 607,20	1,36%
								€ 3 053 527,82	100,00%
			C.19 Corpo stradale da sez C181 a sez C201	803 986,02	2,90%				
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	166	152 393,78	18,95%
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	167	31 198,75	3,88%
						1.04 TERRE RINFORZATE	168	79 620,49	9,90%
						<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
						2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	169	234 088,14	29,12%
						<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	170	28 511,08	3,55%
						<b>4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
						4.01 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	171	204 825,85	25,48%
						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	172	10 165,00	1,26%
						5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	173	5 696,00	0,71%
						<b>6 IMPIANTI</b>			

					6.02 COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	174	51 186,25	6,37%
					7 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI			
					7.01 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI DOLOMITI RETI	175	6 300,68	0,78%
							€ 803 986,02	100,00%
		C.20 Muro di sostegno sez C183-C190 lato dx	196 740,90	0,71%				
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	176	3 293,75	1,67%
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	177	170 281,87	86,55%
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	178	23 165,28	11,77%
							€ 196 740,90	100,00%
		C.21 Muro di sostegno sez C191-C194 lato sx	32 249,42	0,12%				
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	179	691,69	2,14%
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	180	27 204,71	84,36%
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	181	4 353,02	13,50%
							€ 32 249,42	100,00%
		C.22 Ponte sul Torrente Lusumina (sez C201-	535 482,47	1,93%				
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	182	19 971,18	3,73%
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	183	253 496,91	47,34%
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	184	9 203,25	1,72%
					4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO			
					4.01 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	185	241 990,13	45,19%
					6 IMPIANTI			
					6.02 COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	186	10 821,00	2,02%
							€ 535 482,47	100,00%
		C.23 Ponte sul Torrente Lusumina (sez C201-	564 501,49	2,03%				
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	187	82 439,46	14,60%
					2.02 IMPALCATI ED ACCESSORI (GIUNTI-APPOGGI)	188	104 809,98	18,57%
					2.03 MANUFATTI FERROSI E LEGHE	189	357 803,55	63,38%
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.01 IMPERMEABILIZZAZIONI	190	18 083,75	3,20%
					6 IMPIANTI			
					6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	191	1 364,75	0,24%
							€ 564 501,49	100,00%
		C.24 Corpo stradale da sez C209 a sez C311	1 282 837,10	4,62%				
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	192	469 641,86	36,61%
					1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	193	179 960,30	14,03%
					1.04 TERRE RINFORZATE	194	279 647,41	21,80%

					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	195	140 947,32	10,99%
					<b>4</b>	<b>OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
					4.02	PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE - SCOGLIERE	196	18 427,87	1,44%
					<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	197	48 175,49	3,76%
					5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	198	5 824,60	0,45%
					<b>6</b>	<b>IMPIANTI</b>			
					6.02	COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	199	105 642,11	8,24%
					<b>7</b>	<b>SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI</b>			
					7.01	ASSISTENZA SOTTOSERVIZI DOLOMITI RETI	200	4 303,13	0,34%
					7.02	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	201	30 267,01	2,36%
								€ 1 282 837,10	100,00%
				C.26	Muro di controripa sez C249-C256 lato		211 956,90	0,76%	
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	202	2 305,63	1,09%
					<b>2</b>	<b>OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	203	181 413,65	85,59%
					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	204	28 237,62	13,32%
								€ 211 956,90	100,00%
				C.27	Muro di sostegno sez C269-C286 lato sx		319 633,50	1,15%	
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	205	4 216,00	1,32%
					<b>2</b>	<b>OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	206	270 483,79	84,62%
					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	207	44 933,71	14,06%
								€ 319 633,50	100,00%
				C.28	Deviazione Rio Ofsa		445 390,25	1,60%	
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	208	31 816,96	7,14%
					<b>2</b>	<b>OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	209	386 396,79	86,75%
					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	210	8 192,59	1,84%
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	211	12 031,51	2,70%
					<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	212	6 952,40	1,56%
								€ 445 390,25	100,00%
				C.29	Impalcato a setti portanti sez C311-C319		686 246,67	2,47%	
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	213	16 473,68	2,40%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	214	2 847,00	0,41%
					<b>2</b>	<b>OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	215	352 406,42	51,35%
					2.02	IMPALCATI ED ACCESSORI (GIUNTI-APPOGGI)	216	58 687,42	8,55%
					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			

								3.01 IMPERMEABILIZZAZIONI	217	23 524,60	3,43%
								3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	218	2 058,75	0,30%
								<b>4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
								4.01 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	219	230 248,80	33,55%
										€ 686 246,67	100,00%
			C.30 Corpo stradale da sez C319 a sez C366	534 342,40	1,93%			<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
								1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	220	159 179,12	29,79%
								1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	221	41 961,81	7,85%
								1.04 TERRE RINFORZATE	222	245 394,31	45,92%
								<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
								3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	223	57 828,06	10,82%
								<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
								5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	224	20 360,10	3,81%
								5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	225	9 619,00	1,80%
										€ 534 342,40	100,00%
			C.31 Muro di sostegno sez C297-C326 lato sx	1 040 589,81	3,75%			<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
								1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	226	6 587,50	0,63%
								<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
								2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	227	423 962,01	40,74%
								<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
								3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	228	60 684,67	5,83%
								<b>4 OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
								4.01 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	229	549 355,63	52,79%
										€ 1 040 589,81	100,00%
			C.32 Muro di sostegno sez C320-C321 lato dx	58 385,19	0,21%			<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
								1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	230	658,75	1,13%
								2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	231	56 001,88	95,92%
								<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
								3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	232	1 724,56	2,95%
										€ 58 385,19	100,00%
			C.33 Galleria artificiale/parietale "Bieno" (sez	3 472 723,26	12,51%			<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
								1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	233	3 580,20	0,10%
								1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	234	10 799,24	0,31%
								<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
								2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	235	2 971 393,54	85,56%
								2.05 GALLERIE - RIVESTIMENTO DEFINITIVO E ACCESSORI: CASSEFORMI-CLS PER	236	15 653,12	0,45%
								<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
								3.01 IMPERMEABILIZZAZIONI	237	236 582,57	6,81%
								3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	238	146 942,60	4,23%
								<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
								5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	239	10 597,59	0,31%
								5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	240	436,80	0,01%
								<b>6 IMPIANTI</b>			
								6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	241	76 737,60	2,21%

								€ 3 472 723,26	100,00%
		C.34 Corpo stradale da sez C391 a sez C479	292 627,03	1,05%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	242	57 045,21	19,49%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	243	70 077,03	23,95%
					3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	244	135 755,79	46,39%
					5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	245	14 411,58	4,92%
					5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	246	10 918,50	3,73%
					7	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI			
					7.02	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	247	4 418,92	1,51%
								€ 292 627,03	100,00%
		C.35 Sottopasso carrabile sez C456	34 539,75	0,12%					
					5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI			
					5.02	LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	248	34 539,75	100,00%
								€ 34 539,75	100,00%
		C.36 Viabilità secondaria: Pista I-I' - Corpo	7 403,10	0,03%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	249	627,54	8,48%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	250	4 580,53	61,87%
					5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	251	2 195,03	29,65%
								€ 7 403,10	100,00%
		C.37 Viabilità secondaria: Pista L-L' - Corpo	27 013,89	0,10%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	252	24 880,80	92,10%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	253	4,33	0,02%
					5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	254	2 128,76	7,88%
								€ 27 013,89	100,00%
		C.38 Viabilità secondaria: Pista L-L' - Muri e	329 981,12	1,19%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	255	4 743,00	1,44%
					2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	256	283 099,39	85,79%
					3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	257	6 573,71	1,99%
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	258	35 565,02	10,78%
								€ 329 981,12	100,00%
		C.39 Viabilità secondaria: Pista M-M' - Corpo	10 027,86	0,04%					
					1	OPERE D'ARTE IN TERRA			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	259	6 376,61	
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	260	2 184,91	21,79%
					5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	261	1 466,34	14,62%
								€ 10 027,86	36,41%

		C.40 Viabilità secondaria: Pista M-M' - Muri e	313 777,12	1,13%					
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA				
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	262	6 122,50	1,95%	
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI				
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	263	263 318,86	83,92%	
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE				
					3.01 IMPERMEABILIZZAZIONI	264	5 023,20	1,60%	
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	265	39 312,56	12,53%	
							€ 313 777,12	100,00%	
		C.41 Viabilità secondaria: Pista N-N' - Corpo	12 296,61	0,04%					
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA				
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	266	10 383,15	84,44%	
					1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	267	1 048,28	8,52%	
					5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
					5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	268	865,18	7,04%	
							€ 12 296,61	100,00%	
		C.42 Viabilità secondaria: Pista N-N' - Muri	74 634,20	0,27%					
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI				
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	269	64 479,37	86,39%	
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE				
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	270	10 154,83	13,61%	
							€ 74 634,20	100,00%	
		C.43 Viabilità secondaria: Pista O-O' - Corpo	2 824,63	0,01%					
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA				
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	271	115,47	4,09%	
					1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	272	1 467,47	51,95%	
					5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
					5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	273	1 241,69	43,96%	
							€ 2 824,63	100,00%	
		C.44 Viabilità secondaria: Pista P-P' - Corpo	115 664,34	0,42%					
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA				
					1.01 DEMOLIZIONI	274	4 437,50	3,84%	
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	275	40 113,72	34,68%	
					1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	276	509,33	0,44%	
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI				
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	277	64 771,51	56,00%	
					3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE				
					3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	278	3 265,00	2,82%	
					5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI				
					5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	279	2 567,28	2,22%	
							€ 115 664,34	100,00%	
		C.45 Viabilità secondaria: Pista P-P' - Muri e	588 954,98	2,12%					
					1 OPERE D'ARTE IN TERRA				
					1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	280	5 302,94	0,90%	
					2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI				
					2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	281	341 981,25	58,07%	



					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	282	14 226,57	2,42%
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	283	42 131,46	7,15%
					<b>4</b>	<b>OPERE SPECIALI NEL TERRENO</b>			
					4.01	PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, Ecc.	284	185 312,76	31,46%
								€ 588 954,98	100,00%
					C.46	Viabilità secondaria: Pista Q-Q' - Corpo	2 641,22		0,01%
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	285	895,50	33,90%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	286	6,38	0,24%
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	287	1 739,34	65,85%
								€ 2 641,22	100,00%
					C.47	Viabilità secondaria: Pista K-K' - Corpo	10 197,19		0,04%
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	288	4 342,80	42,59%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	289	2 871,24	28,16%
					<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	290	2 983,15	29,25%
								€ 10 197,19	100,00%
					C.48	Viabilità secondaria: Pista K-K' - Muri	192 173,02		0,69%
					<b>2</b>	<b>OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	291	187 940,92	97,80%
					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	292	4 232,10	2,20%
								€ 192 173,02	100,00%
					C.49	Viabilità secondaria: Pista T-T' - Corpo	8,49		0,00%
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	293	8,49	100,00%
								€ 8,49	100,00%
					C.50	Viabilità secondaria: Pista T-T' - Muri e	156 140,97		0,56%
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	294	1 482,19	0,95%
					<b>2</b>	<b>OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
					2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	295	123 711,64	79,23%
					<b>3</b>	<b>OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
					3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	296	5 020,95	3,22%
					3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	297	24 543,75	15,72%
					<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	298	1 382,44	0,89%
								€ 156 140,97	100,00%
					C.51	Viabilità secondaria: Pista W-W' - Muri e	2 873,51		0,01%
					<b>1</b>	<b>OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
					1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	299	23,13	0,80%
					1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	300	2 047,36	71,25%
					<b>5</b>	<b>OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
					5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	301	803,02	27,95%

								€ 2 873,51	100,00%
			C.52 Viabilità secondaria: Pista U-U' - Corpo	12 008,13	0,04%				
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	302	10 530,69 87,70%
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI		
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	303	1 477,44 12,30%
								€ 12 008,13	100,00%
			C.53 Viabilità secondaria: Pista U-U' - Muri e	92 490,07	0,33%				
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	304	1 350,44 1,46%
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	305	1 828,12 1,98%
						2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI		
						2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	306	82 371,16 89,06%
						3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE		
						3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	307	4 511,89 4,88%
						3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	308	2 428,46 2,63%
								€ 92 490,07	100,00%
				27 752 471,92	100,00%				

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO					
	Importo	%		Importo	%	WP	N.	Importo	%		
TRATTA RC-RC'	€ 50 375,53	0,16%									
			F.1 Anello e Innesti Rotatoria RC	29 615,27	58,79%						
						1 OPERE D'ARTE IN TERRA					
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	309	8 310,40	28,06%		
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	310	4 241,91	14,32%		
						5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI					
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	311	5 049,29	17,05%		
						5.02 LAVORI VARI - OPERE IN VERDE	312	4 411,42	14,90%		
						6 IMPIANTI					
						6.01 PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	313	7 602,25	25,67%		
								€ 29 615,27	100,00%		
			F.2 Viabilità secondaria: Pista V-V' - Corpo	5 154,87	10,23%						
						1 OPERE D'ARTE IN TERRA					
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	314	3 471,50	67,34%		
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	315	354,28	6,87%		
						5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI					
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	316	1 329,09	25,78%		
								€ 5 154,87	100,00%		
			F.3 Viabilità secondaria: Pista Z-Z' - Corpo	15 605,39	30,98%						
						1 OPERE D'ARTE IN TERRA					
						1.03 FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	317	13 157,43	84,31%		
						5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI					
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	318	2 447,96	15,69%		
								€ 15 605,39	100,00%		
				50 375,53	100,00%						

SCOMP. DI 1° LIVELLO			SCOMP. DI 2° LIVELLO			SCOMP. DI 3° LIVELLO			
Importo	%		Importo	%		WP	N.	Importo	%
TRATTA EXTRA	€ 594 654,71	1,87%							
			G.1 Pista R-R' - Corpo stradale - sez R1-R19	54 629,16	9,19%				
						1			
						1.01	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.01	DEMOLIZIONI	319	1 606,50 2,94%
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	320	29 535,78 54,07%
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	321	1 838,59 3,37%
						3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE		
						3.02	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	322	12 733,50 23,31%
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI		
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	323	2 606,04 4,77%
						6	IMPIANTI		
						6.01	PREDISPOSIZIONI EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO	324	5 467,25 10,01%
						6.02	COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE	325	841,50 1,54%
									€ 54 629,16 100,00%
			G.2 Pista R-R' - Muro di controripa sez R12-	461,13	0,08%				
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	326	461,13 100,00%
								327	€ 461,13 100,00%
			G.3 Pista R-R' - Sovrappasso svincolo per	209 228,53	35,18%				
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	328	2 653,58 1,27%
						2	OPERE D'ARTE STRUTTURALI		
						2.01	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	329	89 374,83 42,72%
						2.02	IMPALCATI ED ACCESSORI (GIUNTI-APPOGGI)	330	112 808,94 53,92%
						2.03	MANUFATTI FERROSI E LEGHE	331	570,00 0,27%
						3	OPERE D'ARTE IDRAULICHE		
						3.01	IMPERMEABILIZZAZIONI	332	3 821,18 1,83%
									€ 209 228,53 100,00%
			G.4 Pista R-R' - Corpo stradale - sez R22-R29	10 824,73	1,82%				
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.02	SBANCAMENTI E SCAVI	333	8 205,02 75,80%
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	334	461,46 4,26%
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI		
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	335	2 158,25 19,94%
									€ 10 824,73 100,00%
			G.5 Pista R-R' - Corpo stradale - sez R29-	21 204,46	3,57%				
						5	OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI		
						5.01	PAVIMENTAZIONI (fondazione)	336	21 204,46 100,00%
									€ 21 204,46 100,00%
			G.6 Viabilità secondaria: Pista S-S' - Corpo	4 036,28	0,68%				
						1	OPERE D'ARTE IN TERRA		
						1.03	FORMAZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	337	601,84 14,91%

						<b>5 OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI</b>			
						5.01 PAVIMENTAZIONI (fondazione)	338	3 434,44	85,09%
								€ 4 036,28	100,00%
			G.7 Viabilità secondaria: Pista S-S' - Muri sez	294 270,42	49,49%				
						<b>1 OPERE D'ARTE IN TERRA</b>			
						1.02 SBANCAMENTI E SCAVI	340	4 216,00	1,43%
						<b>2 OPERE D'ARTE STRUTTURALI</b>			
						2.01 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	341	282 583,46	96,03%
						<b>3 OPERE D'ARTE IDRAULICHE</b>			
						3.02 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	342	7 470,96	2,54%
								€ 294 270,42	100,00%
			100,00%	594 654,71	100,00%				
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 31 764 778,12</b>					<b>31 764 778,12</b>	
